		Name	Duration: Current	Duration: Previous	Duration: Diff	Start: Current	Start: Previous	Start: Diff	Finish: Current	Finish: Previous	Finish: Diff
1		**Public Storage - 1061**	**364d**	**156d**	**208d**	**5/27/25**	**5/27/25**	**0d**	**11/3/26**	**1/12/26**	**211d**
2		Notice to Proceed	0d	0d	0d	5/27/25	5/27/25	0d	5/27/25	5/27/25	0d
3	?	Demolition Permit	103d	96d	7d	5/27/25	5/27/25	0d	10/21/25	10/10/25	7d
4	+	Demolition Permit	10d			10/22/25			11/4/25		
5	+	Building Permit Rec	1d			10/30/25			10/30/25		
6	+	Traffic Control Perr	1d			12/1/25			12/1/25		
7		SDGE Removal of T	1d	1d	0d	10/6/25	10/6/25	0d	10/6/25	10/6/25	0d
8		Mobilization	2d	5d	-3d	10/31/25	10/6/25	19d	11/3/25	10/10/25	16d
9		Switchgear Submit	1d	15d	-14d	9/11/25	9/22/25	-7d	9/11/25	10/10/25	-21d
10		CO #4 - ADS Deten	40d	40d	0d	7/16/25	7/16/25	0d		9/10/25	Different
11		Chamber System S	7d	20d	-13d	11/5/25	10/27/25	7d	11/13/25	11/21/25	-6d
12		ADS Detention Syst	30d	30d	0d	11/14/25	11/24/25	-6d	12/31/25	1/12/26	-8d
13		**Public Storage Ove**	**289d**	**264d**	**25d**	**9/12/25**	**10/8/25**	**-18d**	**11/3/26**	**10/23/26**	**7d**
14		**Surface Demo &**	**44d**	**48d**	**-4d**	**10/17/25**	**10/8/25**	**7d**	**12/19/25**	**12/16/25**	**3d**
15		Erosion Contr	3d	3d	0d	10/17/25	10/8/25	7d	10/21/25	10/10/25	7d
16	–	Received Traf		1d			10/21/25			10/21/25	
17		Mock Pre-Con	1d	1d	0d	10/22/25	10/22/25	0d	10/22/25	10/22/25	0d
18		Submitted Ap	20d	20d	0d	10/23/25	10/23/25	0d	11/19/25	11/19/25	0d
19	+	Received Traf	1d			12/1/25			12/1/25		
20		City List of Ite	1d	1d	0d	11/5/25	11/20/25	-11d	11/5/25	11/20/25	-11d
21	+	Moratorium L	27d			10/22/25			12/1/25		
22	?	Pre Con Meet	10d	1d	9d	12/2/25	11/21/25	7d	12/15/25	11/21/25	16d
23		Demo Existing	10d	10d	0d	10/22/25	10/13/25	7d	11/4/25	10/24/25	7d
24		Site Survey, B	1d	1d	0d	11/4/25	10/24/25	7d	11/4/25	10/24/25	7d
25		Pre Grading M	1d	1d	0d	11/4/25	10/24/25	7d	11/4/25	10/24/25	7d
26	+	Underground	2d			11/4/25			11/5/25		
27		Install Shoring	11d	13d	-2d	12/5/25	11/21/25	10d	12/19/25	12/11/25	6d
28		Over-Ex & Rec	9d	12d	-3d	11/6/25	11/21/25	-11d	11/18/25	12/10/25	-16d
29	+	Rain Delay	6d			11/19/25			11/26/25		
30	+	Completion o	2d			12/1/25			12/2/25		
31		Certify Pad / F	3d	3d	0d	12/3/25	12/12/25	-7d	12/5/25	12/16/25	-7d
32		Building Perm	0d	0d	0d	12/5/25	12/16/25	-7d	12/5/25	12/16/25	-7d
33		**Site Improveme**	**20d**	**20d**	**0d**	**1/5/26**	**1/13/26**	**-6d**	**1/30/26**	**2/9/26**	**-6d**
34		Install Private	15d	15d	0d	1/5/26	1/13/26	-6d	1/23/26	2/2/26	-6d
35		Install Offsite	5d	5d	0d	1/5/26	1/13/26	-6d	1/9/26	1/19/26	-6d
36		Install Site Sev	5d	5d	0d	1/5/26	1/13/26	-6d	1/9/26	1/19/26	-6d
37		Install Private	4d	4d	0d	1/12/26	1/20/26	-6d	1/15/26	1/23/26	-6d
38		Install Dry Uti	5d	5d	0d	1/16/26	1/26/26	-6d	1/22/26	1/30/26	-6d
39		Install Drainag	5d	5d	0d	1/26/26	2/3/26	-6d	1/30/26	2/9/26	-6d
40		**Early AC Paving**	**18d**	**18d**	**0d**	**2/2/26**	**2/10/26**	**-6d**	**2/26/26**	**3/6/26**	**-6d**
41		Survey & Grac	2d	2d	0d	2/2/26	2/10/26	-6d	2/3/26	2/11/26	-6d
42		UG Electric Sit	3d	3d	0d	2/4/26	2/12/26	-6d	2/6/26	2/17/26	-7d
43		Irrigation Slee	3d	3d	0d	2/4/26	2/12/26	-6d	2/6/26	2/17/26	-7d
44		Form & Pour (	3d	3d	0d	2/9/26	2/18/26	-7d	2/11/26	2/20/26	-7d
45		Grade & Pour	7d	7d	0d	2/12/26	2/23/26	-7d	2/23/26	3/3/26	-6d
46		Agg Base impo	3d	3d	0d	2/24/26	3/4/26	-6d	2/26/26	3/6/26	-6d
47		**Building Shell Co**	**217d**	**198d**	**19d**	**12/8/25**	**12/17/25**	**-7d**	**10/15/26**	**9/29/26**	**12d**
48		Underslab Plu	10d	8d	2d	12/8/25	12/17/25	-7d	12/19/25	12/30/25	-7d

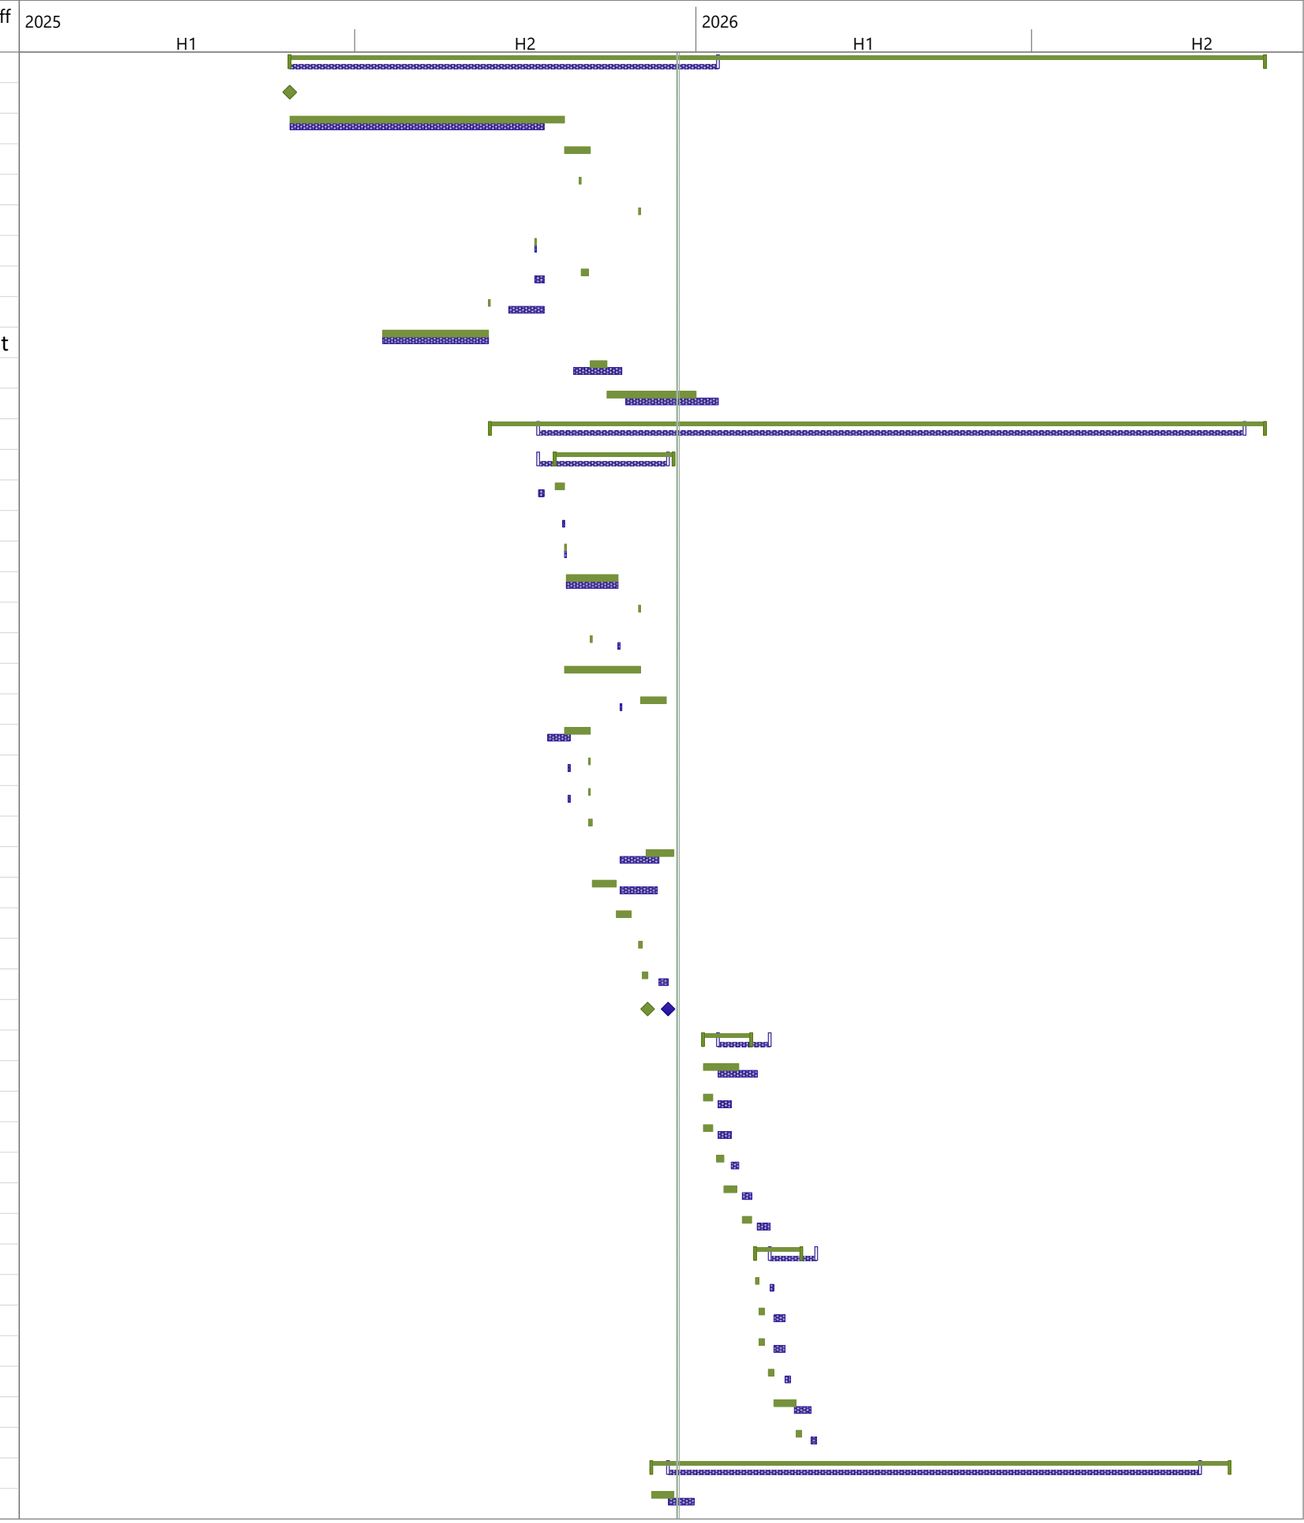

		Name	Duration: Current	Duration: Previous	Duration: Diff	Start: Current	Start: Previous	Start: Diff	Finish: Current	Finish: Previous	Finish: Diff
49		Elevator Pits E	10d	10d	0d	12/8/25	12/17/25	-7d	12/19/25	1/5/26	-11d
50		Drill & Set Jac	5d	5d	0d	12/8/25	1/6/26	-21d	12/12/25	1/12/26	-21d
51		Bldg. Wall Ftg	8d	13d	-5d	12/10/25	12/22/25	-8d	12/19/25	1/13/26	-17d
52		CMU Stem W	9d	10d	-1d	12/17/25	1/12/26	-18d	12/31/25	1/23/26	-17d
53		Fine Grade Sla	1d	5d	-4d	1/5/26	1/21/26	-12d	1/5/26	1/27/26	-16d
54		Reinforce Slab	2d	3d	-1d	1/6/26	1/28/26	-16d	1/7/26	1/30/26	-17d
55		Inspection	1d	1d	0d	1/7/26	2/2/26	-18d	1/7/26	2/2/26	-18d
56		Pour Slab on (	1d	1d	0d	1/8/26	2/3/26	-18d	1/8/26	2/3/26	-18d
57		CMU walls/Le	15d	22d	-7d	1/9/26	1/26/26	-11d	1/29/26	2/25/26	-19d
58		CMU walls/Le	15d	15d	0d	1/9/26	2/4/26	-18d	1/29/26	2/25/26	-19d
59		Shearwalls/Be	20d	25d	-5d	1/30/26	2/11/26	-8d	2/27/26	3/18/26	-13d
60		Deck (Able)	3d	3d	0d	3/2/26	3/19/26	-13d	3/4/26	3/23/26	-13d
61	?	Reinforce for	2d	3d	-1d	3/5/26	3/24/26	-13d	3/6/26	3/26/26	-14d
62		Inspection	1d	1d	0d	3/6/26	3/27/26	-15d	3/6/26	3/27/26	-15d
63		Pour 2nd floo	1d	1d	0d	3/9/26	3/30/26	-15d	3/9/26	3/30/26	-15d
64		Deck cure	3d	4d	-1d	3/10/26	3/31/26	-15d	3/12/26	4/3/26	-16d
65		CMU Walls/Le	15d	15d	0d	3/13/26	4/6/26	-16d	4/2/26	4/24/26	-16d
66		CMU Walls/Le	15d	47d	-32d	3/13/26	2/26/26	11d	4/2/26	5/1/26	-21d
67		Shearwalls/Be	20d	29d	-9d	4/3/26	4/7/26	-2d	4/30/26	5/15/26	-11d
68		Deck for 3rd f	3d	3d	0d	5/1/26	5/18/26	-11d	5/5/26	5/20/26	-11d
69		Reinforce for	2d	3d	-1d	5/6/26	5/21/26	-11d	5/7/26	5/26/26	-13d
70		Inspection	1d	1d	0d	5/7/26	5/27/26	-14d	5/7/26	5/27/26	-14d
71		Pour 3rd floo	1d	1d	0d	5/8/26	5/28/26	-14d	5/8/26	5/28/26	-14d
72		Deck Cure	5d	4d	1d	5/11/26	5/29/26	-14d	5/15/26	6/3/26	-13d
73		CMU Walls/R	15d	15d	0d	5/18/26	6/4/26	-13d	6/8/26	6/24/26	-12d
74		CMU Walls/R	15d	42d	-27d	5/18/26	5/4/26	10d	6/8/26	7/1/26	-17d
75		Shearwalls/Be	18d	29d	-11d	6/9/26	6/5/26	2d	7/2/26	7/16/26	-10d
76		Roof Deck (Ab	3d	3d	0d	7/6/26	7/17/26	-9d	7/8/26	7/21/26	-9d
77		Roof Structur	5d	5d	0d	7/9/26	7/22/26	-9d	7/15/26	7/28/26	-9d
78		Install roof ac	7d	5d	2d	7/9/26	7/17/26	-6d	7/17/26	7/23/26	-4d
79		Roof Insulatio	15d	15d	0d	7/20/26	7/24/26	-4d	8/7/26	8/13/26	-4d
80		Set Rooftop E	3d	3d	0d	8/10/26	8/14/26	-4d	8/12/26	8/18/26	-4d
81		Elevator Cons	20d	15d	5d	8/10/26	7/22/26	13d	9/4/26	8/11/26	18d
82		Elevator Cons	20d	15d	5d	8/31/26	8/12/26	13d	9/25/26	9/1/26	18d
83		State Elevator	14d	20d	-6d	9/28/26	9/2/26	18d	10/15/26	9/29/26	12d
84		**Building Interior**	**125d**	**121d**	**4d**	**3/5/26**	**3/24/26**	**-13d**	**8/28/26**	**9/10/26**	**-9d**
85		Layout & Insta	3d	3d	0d	3/5/26	3/24/26	-13d	3/9/26	3/26/26	-13d
86		Overhead M,F	15d	15d	0d	3/10/26	3/27/26	-13d	3/30/26	4/16/26	-13d
87		Hallway Syste	15d	15d	0d	3/24/26	4/10/26	-13d	4/13/26	4/30/26	-13d
88		Finish Mech. &	3d	3d	0d	4/14/26	5/1/26	-13d	4/16/26	5/5/26	-13d
89		Layout & Insta	3d	3d	0d	5/8/26	5/27/26	-13d	5/12/26	5/29/26	-13d
90		Overhead M,	15d	15d	0d	5/13/26	6/1/26	-13d	6/3/26	6/19/26	-12d
91		Hallway Syste	15d	15d	0d	5/28/26	6/15/26	-12d	6/17/26	7/6/26	-13d
92		Finish Mech. &	3d	3d	0d	6/18/26	7/7/26	-13d	6/22/26	7/9/26	-13d
93		Install HM Do	9d	9d	0d	6/23/26	7/10/26	-13d	7/6/26	7/22/26	-12d
94		Layout & Insta	5d	5d	0d	7/6/26	7/17/26	-9d	7/10/26	7/23/26	-9d
95		Overhead M,F	15d	15d	0d	7/13/26	7/24/26	-9d	7/31/26	8/13/26	-9d
96		Hallway Syste	15d	15d	0d	7/27/26	8/7/26	-9d	8/14/26	8/27/26	-9d

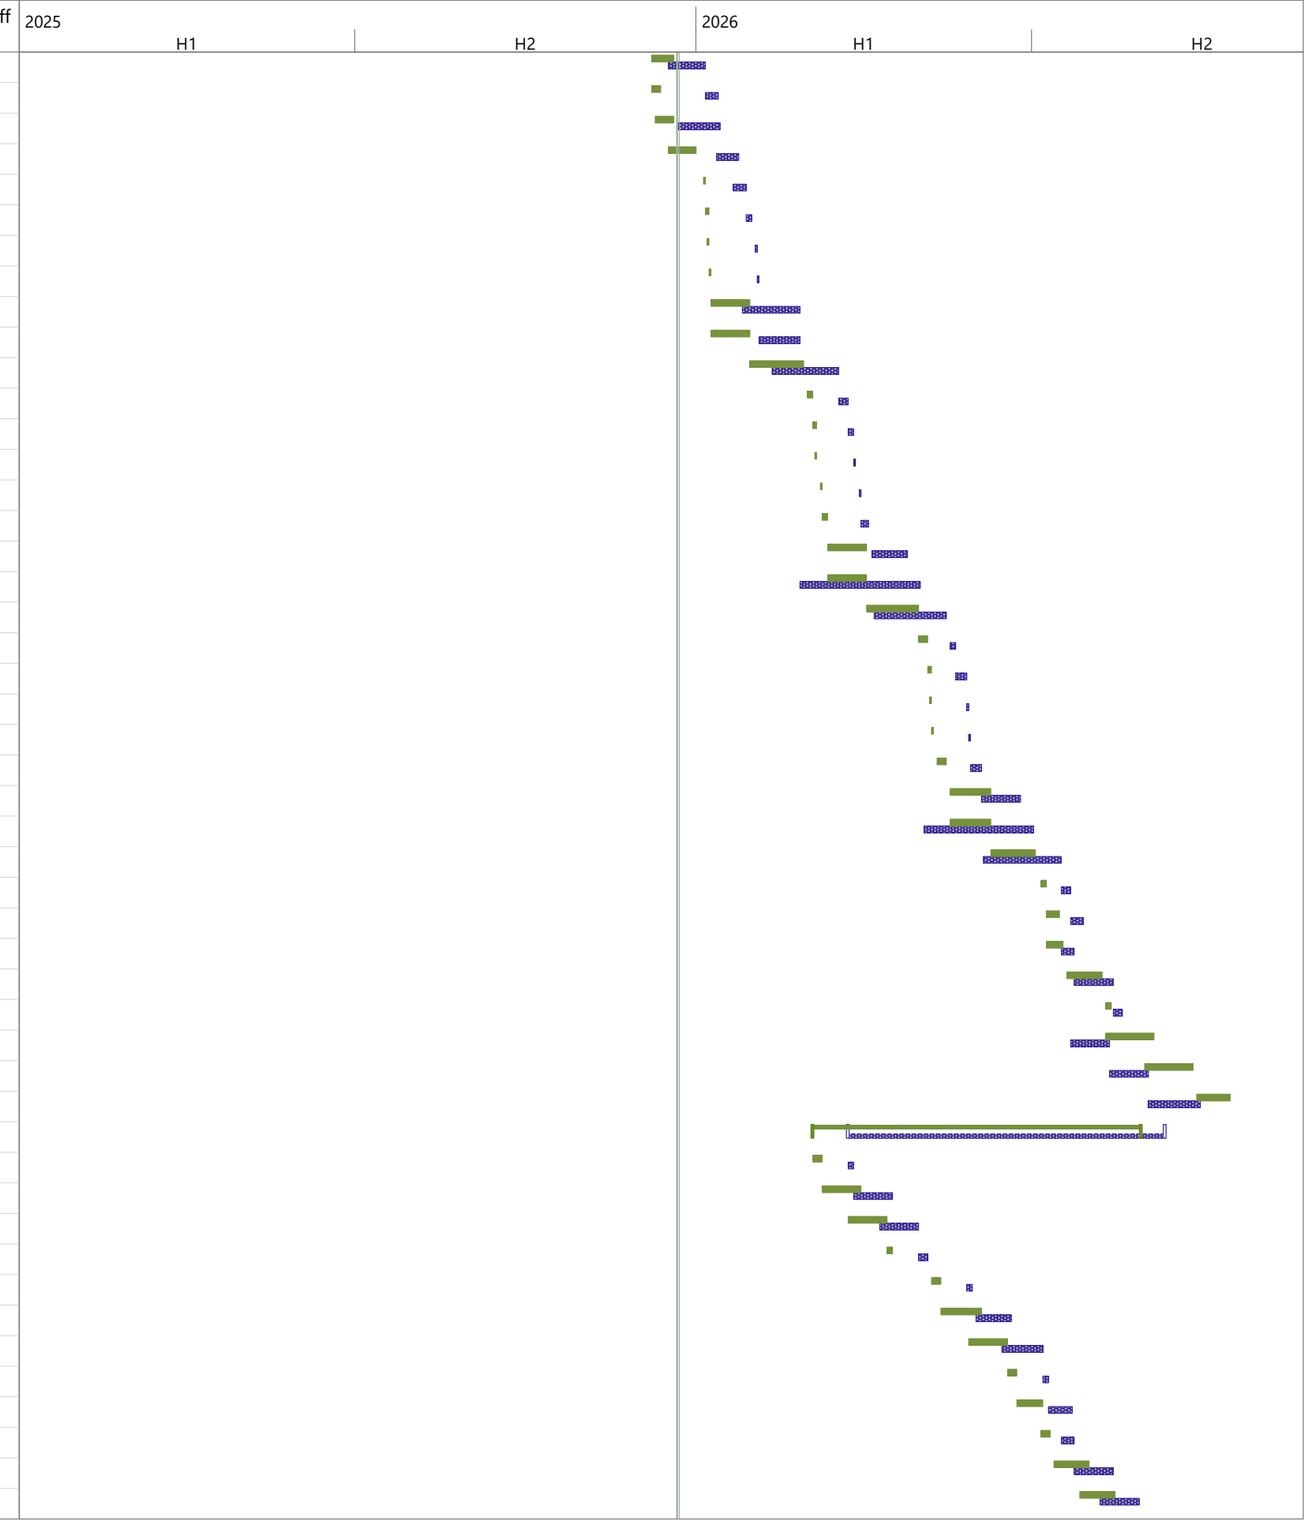

	Name	Duration: Current	Duration: Previous	Duration: Diff	Start: Current	Start: Previous	Start: Diff	Finish: Current	Finish: Previous	Finish: Diff
97	Electrical Roo	15d	15d	0d	8/3/26	8/14/26	-9d	8/21/26	9/3/26	-9d
98	Finish Painting	5d	5d	0d	8/10/26	8/14/26	-4d	8/14/26	8/20/26	-4d
99	Final Clean up	10d	10d	0d	8/17/26	8/28/26	-9d	8/28/26	9/10/26	-9d
100	**Switchgear, City**	**211d**	**197d**	**14d**	**9/12/25**	**10/13/25**	**-21d**	**7/16/26**	**7/27/26**	**-7d**
101	Switchgear Or	150d	150d	0d	9/12/25	10/13/25	-21d	4/20/26	5/19/26	-21d
102	Install Dry Uti	5d	5d	0d	4/21/26	5/20/26	-21d	4/27/26	5/27/26	-22d
103	Switchgear De	4d	4d	0d	5/11/26	5/20/26	-7d	5/14/26	5/26/26	-8d
104	Single line Ele	5d	5d	0d	5/15/26	5/27/26	-8d	5/21/26	6/2/26	-8d
105	SDG&E Utility	3d	3d	0d	5/22/26	6/3/26	-8d	5/27/26	6/5/26	-7d
106	SDG&E Utility	30d	30d	0d	5/28/26	6/8/26	-7d	7/9/26	7/20/26	-7d
107	Set Transform	5d	5d	0d	7/10/26	7/21/26	-7d	7/16/26	7/27/26	-7d
108	**Site Improveme**	**38d**	**38d**	**0d**	**6/9/26**	**6/25/26**	**-12d**	**7/31/26**	**8/18/26**	**-12d**
109	Install Private	15d	15d	0d	6/9/26	6/25/26	-12d	6/29/26	7/16/26	-13d
110	Install Offsite	5d	5d	0d	6/9/26	6/25/26	-12d	6/15/26	7/1/26	-12d
111	Install Site Sev	5d	5d	0d	6/16/26	7/2/26	-12d	6/22/26	7/9/26	-13d
112	Install Private	4d	4d	0d	6/23/26	7/10/26	-13d	6/26/26	7/15/26	-13d
113	Install Drainag	5d	5d	0d	6/30/26	7/17/26	-13d	7/7/26	7/23/26	-12d
114	Survey & Grac	2d	2d	0d	7/8/26	7/24/26	-12d	7/9/26	7/27/26	-12d
115	UG Electric Sit	3d	3d	0d	7/10/26	7/28/26	-12d	7/14/26	7/30/26	-12d
116	Irrigation Slee	3d	3d	0d	7/10/26	7/28/26	-12d	7/14/26	7/30/26	-12d
117	Form & Pour (	3d	3d	0d	7/15/26	7/31/26	-12d	7/17/26	8/4/26	-12d
118	Grade & Pour	7d	7d	0d	7/20/26	8/5/26	-12d	7/28/26	8/13/26	-12d
119	Agg Base impo	3d	3d	0d	7/29/26	8/14/26	-12d	7/31/26	8/18/26	-12d
120	**Offsite improve**	**24d**	**24d**	**0d**	**8/3/26**	**8/19/26**	**-12d**	**9/3/26**	**9/21/26**	**-12d**
121	Demo & Grad	4d	4d	0d	8/3/26	8/19/26	-12d	8/6/26	8/24/26	-12d
122	Offsite Concre	4d	4d	0d	8/7/26	8/25/26	-12d	8/12/26	8/28/26	-12d
123	Offsite AC Pat	4d	4d	0d	8/13/26	8/31/26	-12d	8/18/26	9/3/26	-12d
124	Offsite Stripin	3d	3d	0d	8/19/26	9/4/26	-12d	8/21/26	9/8/26	-12d
125	Final Public W	2d	2d	0d	8/24/26	9/9/26	-12d	8/25/26	9/10/26	-12d
126	Final Planning	2d	2d	0d	8/26/26	9/11/26	-12d	8/27/26	9/14/26	-12d
127	Owner Civil Pu	5d	5d	0d	8/28/26	9/15/26	-12d	9/3/26	9/21/26	-12d
128	**Building Exterio**	**67d**	**67d**	**0d**	**6/9/26**	**6/25/26**	**-12d**	**9/10/26**	**9/28/26**	**-12d**
129	Install Scaffolc	1d	1d	0d	6/9/26	6/25/26	-12d	6/9/26	6/25/26	-12d
130	Exterior Meta	5d	5d	0d	6/10/26	6/26/26	-12d	6/16/26	7/2/26	-12d
131	Install Storefr	5d	5d	0d	6/17/26	7/6/26	-13d	6/23/26	7/10/26	-13d
132	EIFS	5d	5d	0d	6/24/26	7/13/26	-13d	6/30/26	7/17/26	-13d
133	Exterior Paint	10d	10d	0d	6/17/26	7/6/26	-13d	6/30/26	7/17/26	-13d
134	Install Metal F	5d	5d	0d	7/1/26	7/20/26	-13d	7/8/26	7/24/26	-12d
135	Install Steel Ca	5d	5d	0d	7/9/26	7/27/26	-12d	7/15/26	7/31/26	-12d
136	Exterior Break	5d	5d	0d	7/16/26	8/3/26	-12d	7/22/26	8/7/26	-12d
137	Remove Scaff	1d	1d	0d	7/23/26	8/10/26	-12d	7/23/26	8/10/26	-12d
138	Office Framing	6d	6d	0d	7/16/26	8/3/26	-12d	7/23/26	8/10/26	-12d
139	Office M/E/P	6d	6d	0d	7/24/26	8/11/26	-12d	7/31/26	8/18/26	-12d
140	Office Drywall	10d	10d	0d	8/3/26	8/19/26	-12d	8/14/26	9/1/26	-12d
141	Suspended Ce	6d	6d	0d	8/17/26	9/2/26	-12d	8/24/26	9/9/26	-12d
142	Office Fixtures	6d	6d	0d	8/25/26	9/10/26	-12d	9/1/26	9/17/26	-12d
143	Final Electrica	3d	3d	0d	9/2/26	9/18/26	-12d	9/4/26	9/22/26	-12d
144	Final Mechani	3d	3d	0d	9/7/26	9/23/26	-12d	9/9/26	9/25/26	-12d

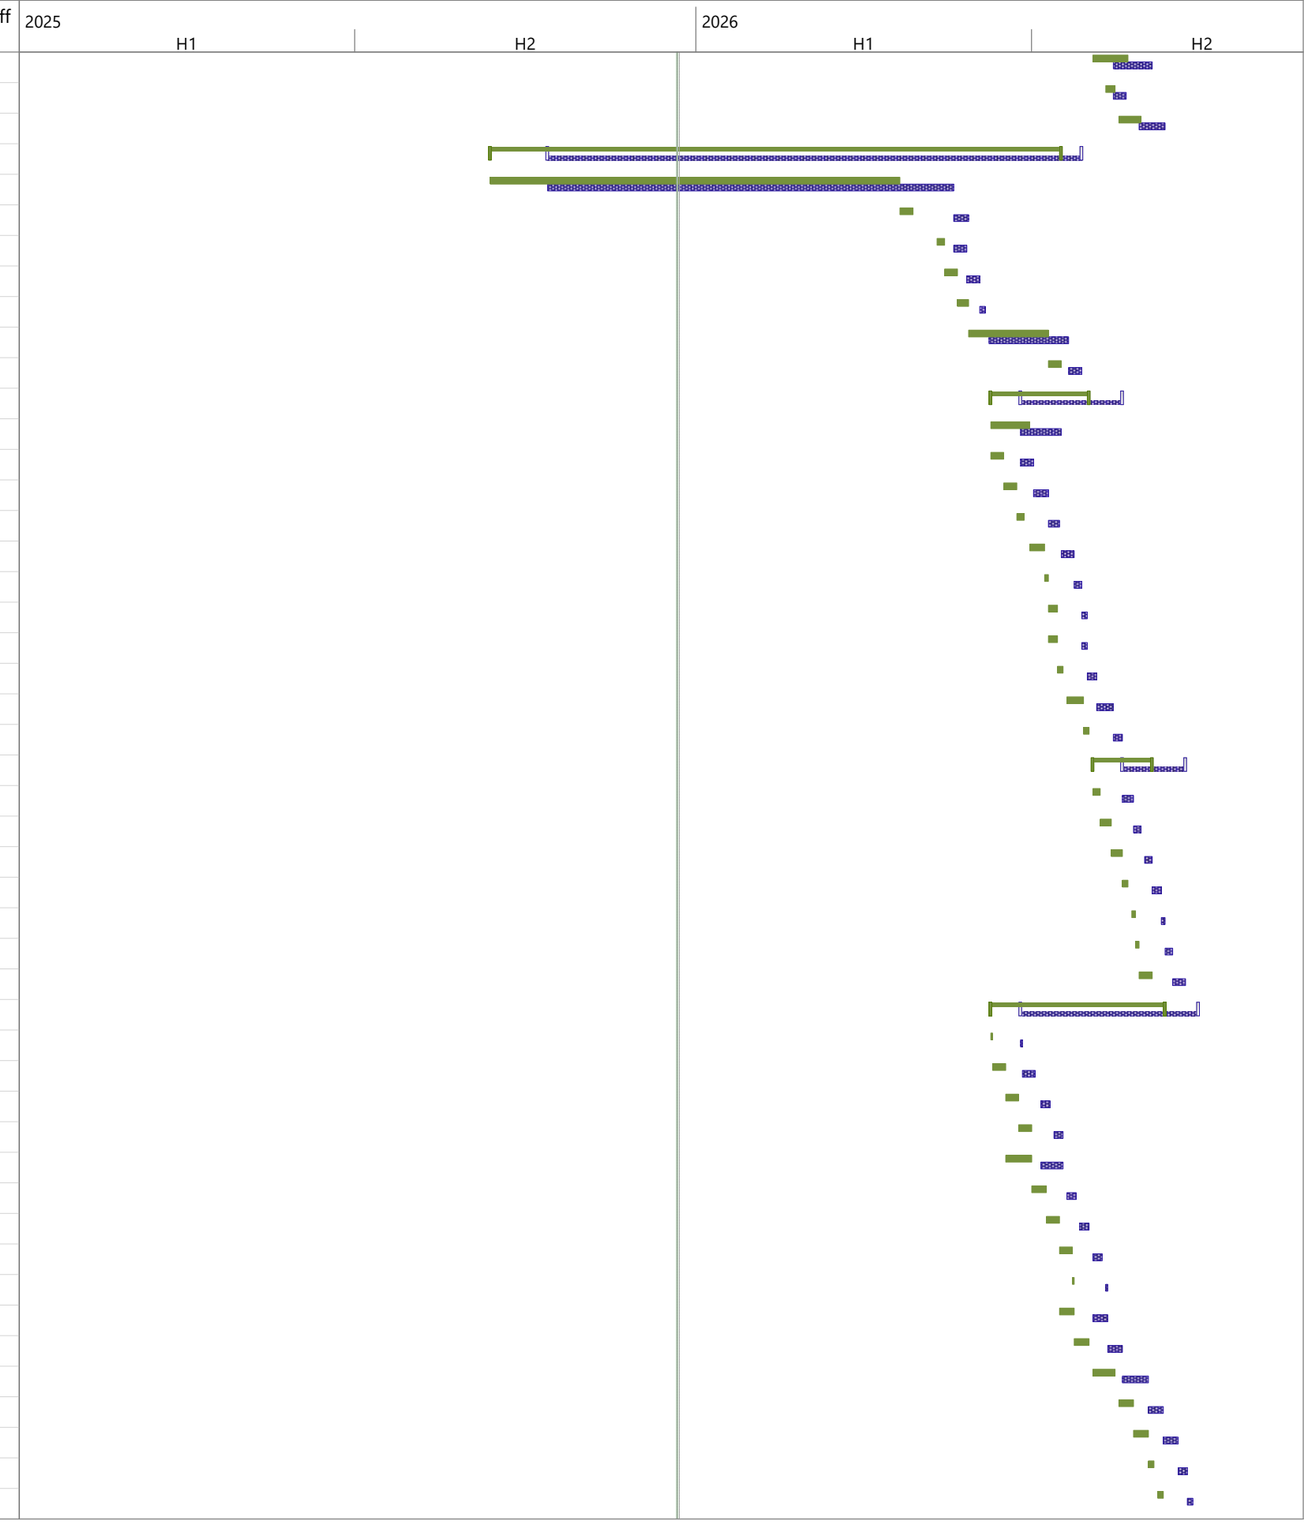
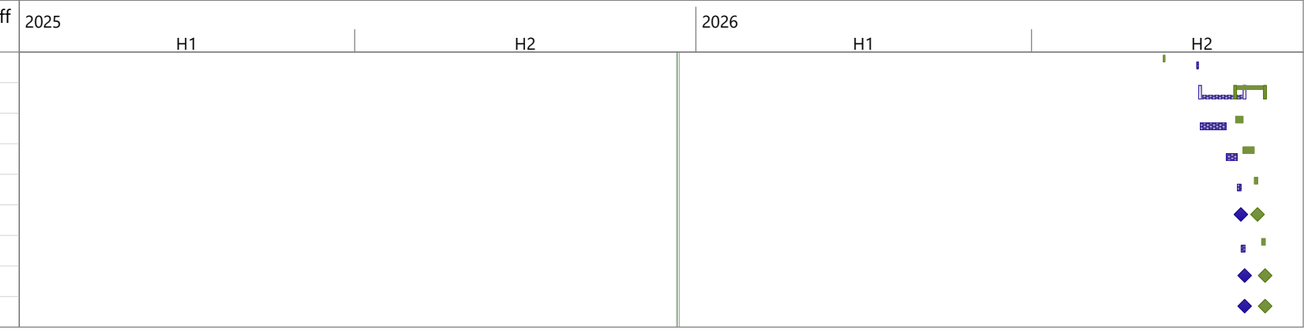
		Name	Duration: Current	Duration: Previous	Duration: Diff	Start: Current	Start: Previous	Start: Diff	Finish: Current	Finish: Previous	Finish: Diff
145		Office Comple	1d	1d	0d	9/10/26	9/28/26	-12d	9/10/26	9/28/26	-12d
146		**Accumulative Bu**	**12d**	**18d**	**-6d**	**10/19/26**	**9/30/26**	**13d**	**11/3/26**	**10/23/26**	**7d**
147		Rain/Weather	4d	10d	-6d	10/19/26	9/30/26	13d	10/22/26	10/13/26	7d
148		Life Safety & F	4d	4d	0d	10/23/26	10/14/26	7d	10/28/26	10/19/26	7d
149		Building Final	2d	2d	0d	10/29/26	10/20/26	7d	10/30/26	10/21/26	7d
150		Substantial Co	0d	0d	0d	10/30/26	10/21/26	7d	10/30/26	10/21/26	7d
151		Certificate Of	2d	2d	0d	11/2/26	10/22/26	7d	11/3/26	10/23/26	7d
152		Open Date	0d	0d	0d	11/3/26	10/23/26	7d	11/3/26	10/23/26	7d
153		Final Complet	0d	0d	0d	11/3/26	10/23/26	7d	11/3/26	10/23/26	7d
